

## Информация

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализации региональных проектов Республики Хакасия, входящих в состав национальных проектов, за период 2021-2023 годов и 9 месяцев 2024 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 2.15. Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2024 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 15.12.2023.


Целью мероприятия являлась оценка исполнения региональных проектов и достижение показателей и результатов за период 2021-2023 годов, а также оценка реализации региональных проектов за 9 месяцев 2024 года и выявление основных рисков, влияющих на достижение целей и ожидаемых результатов региональных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В Республике Хакасия осуществляется реализация национальных проектов по 5 национальным целям развития РФ: в 2021 году в отношении 42 региональных проектов, в 2023 годах – 43 проектов, в 2022 и 2024 годах – 44 проектов.

По плановому объему средств на реализацию национальных проектов в 2022-2023 годах на душу населения, Республика Хакасия занимает 6 место среди субъектов СФО, что составляет 13,7 и 13,6 тыс. рублей на человека, в 2024 году – 7 место (12 тыс. рублей на человека). Наблюдается *снижение планового объема средств на душу населения на 1,7 тыс. рублей на человека в 2024 году.*

### структура источников РП, %

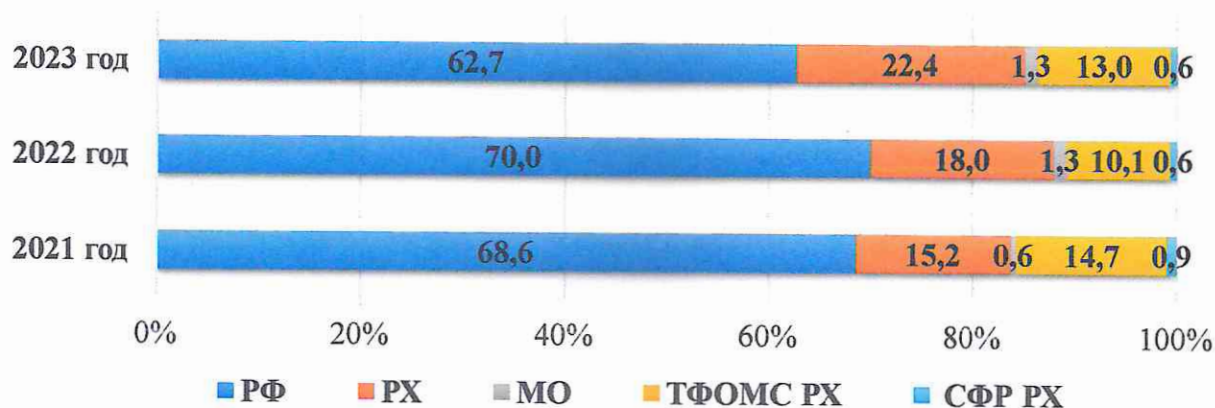

В 2023 году отмечается тенденция к увеличению расходов на реализацию региональных проектов из республиканского бюджета на 7,2 процентного пункта к 2021 году и бюджетов муниципальных образований на 0,7 процентного пункта, при одновременном снижении финансирования из федерального бюджета на 5,9 процентного пункта, внебюджетных фондов на 2 процентных пункта.


За период 2021-2023 годов и 9 месяцев 2024 года фактические расходы на реализацию региональных проектов составили в 2021 году – 5,7 млрд. рублей, или 89,8% плана, в 2022 году – 8,2 млрд. рублей (94,2%), в 2023 году – 8,1 млрд. рублей (94,9%) и за 9 месяцев 2024 года – 3 млрд. рублей (48,6%).

## Объем неосвоенных средств по РП, млн. рублей



Наибольшие объемы неосвоения средств федерального и республиканского бюджетов по сводной бюджетной росписи на 2021-2023 годов приходятся на 4 национальных проекта (95,1% общего объема неосвоенных средств, 85,5% и 97,4% соответственно).

## Исполнение мероприятий региональных проектов по отдельным главным распорядителям средств республиканского бюджета за 9 месяцев 2024 года, %

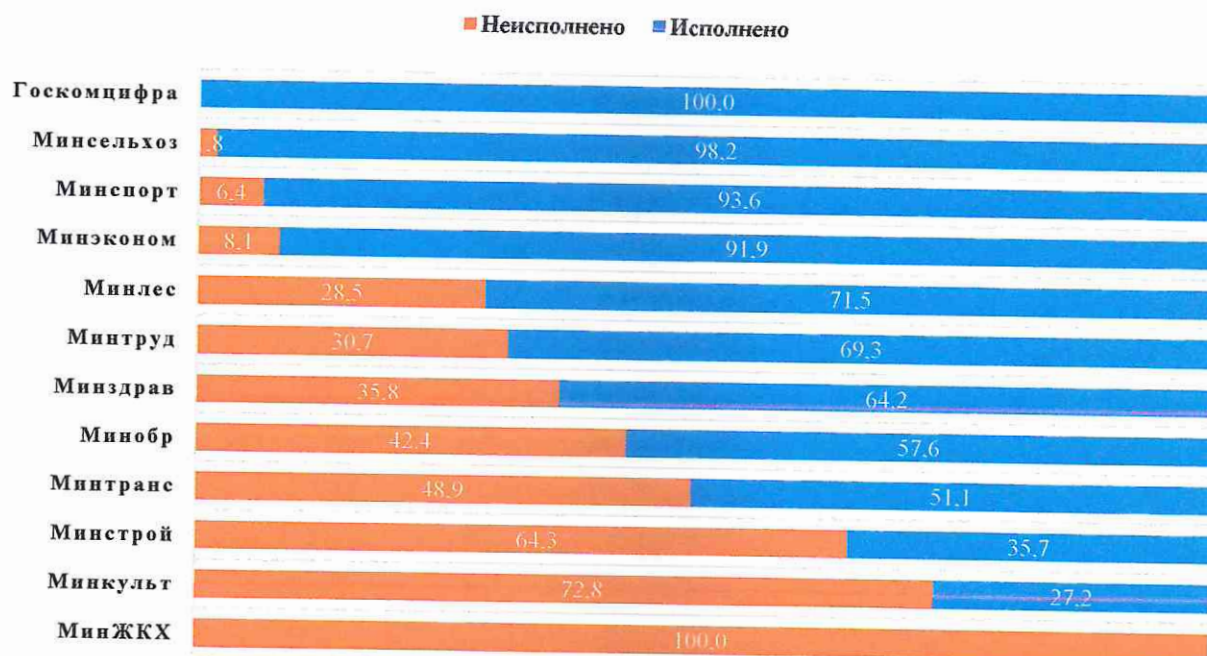

Отсутствие кассового исполнения по состоянию на 01.10.2024 по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обусловлено проведением мероприятий в конце 2024 года по строительству транзитного водопровода от станции водоподъема до ст. Луговая рп. Усть-Абакан в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию региональных проектов, за 9 месяцев 2024 года исполнены на 100% по одному ГРБС.

По результатам оценки реализации региональных проектов в проверяемом периоде Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия выявлены основные нарушения и риски, влияющие на достижение целей и ожидаемых результатов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов:

*удорожание работ* по контрактам, заключенным первоначально на строительство (реконструкцию), по 10 объектам на общую сумму 715,3 млн рублей;

*риски неосвоения* бюджетных ассигнований федерального бюджета на общую сумму 613,4 млн рублей (РП «Современная школа», РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», РП «Чистая вода», РП «Региональная и местная дорожная сеть» и РП «Культурная среда»);

*наличие кредиторской задолженности* на 01.10.2024 на общую сумму 13 млн рублей по 2 региональным проектам (РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и РП «Региональная и местная дорожная сеть»);

*риски безрезультативных расходов* и как следствие неэффективного их использования на общую сумму 90,6 млн рублей (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и РП «Чистая вода»);

*риск недостижения заданного результата* с использованием бюджетных средств в общей сумме 94 млн рублей (РП «Региональная и местная дорожная сеть»);

*риски недостижения контрольных точек* по 8 региональным проектам (РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», РП «Современная школа», РП «Успех каждого ребенка», РП «Творческие люди», РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», РП «Культурная среда» РП «Чистая вода» и РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»);

*риски несвоевременного завершения* строительства и реализации мероприятий по 13 объектам (РП «Старшее поколение», РП «Современная школа», РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», РП «Чистая вода», РП «Культурная среда» и РП «Региональная и местная дорожная сеть»);

*недостижение плановых значений* 16 целевых показателей что составляет 12,3% общего количества показателей по республике (130) по 5 национальным проектам (НП «Демография» (1 показатель), НП «Здравоохранение» (11 показателей), НП «Образование» (2), и НП «Жилье и городская среда» (1), НП «Культура» (1)).

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о недостаточном контроле кураторов и руководителей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, за ходом их реализации, о принятии в отдельных случаях неэффективных управленческих решений, влекущих риски безрезультативных и неэффективных расходов, а также возникновение дополнительной нагрузки на республиканский бюджет на завершение строительства (реконструкции) объектов вследствие несвоевременного освоения бюджетных ассигнований федерального бюджета и необходимости их возврата.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия министерствам Республики Хакасия сформированы предложения по достижению конечных результатов региональных проектов в Республике Хакасия на конец 2024 года.

Председатель Контрольно-счетной  
палаты Республики Хакасия

О.А. Лях
